

スカイジャスター 作業開始前点検表


点検者名		型式能力	SJ-125型 / 125t・m ²
機械所有者名		機械番号	

【取扱注意事項】

- ・異常が発見された場合は機械を停止し、早急に管理責任者に報告して不具合対策を行うこと。
- ・FW 回転時は車輛などで運搬しないこと。
- ・旋回動作時には旋回範囲内に立ち入らないこと。
- ・修理・点検時には電源を遮断すること。
- ・プログラムの変更を行わないこと。
- ・電気機器・回路の改造を行わないこと。
- ・ガス・溶接作業(本体加工)、機械的改造は行わないこと。
- ・使用時および保管時は塩害対策を行うこと。

管 理 責任者印	
-------------	--

調整・修理記録

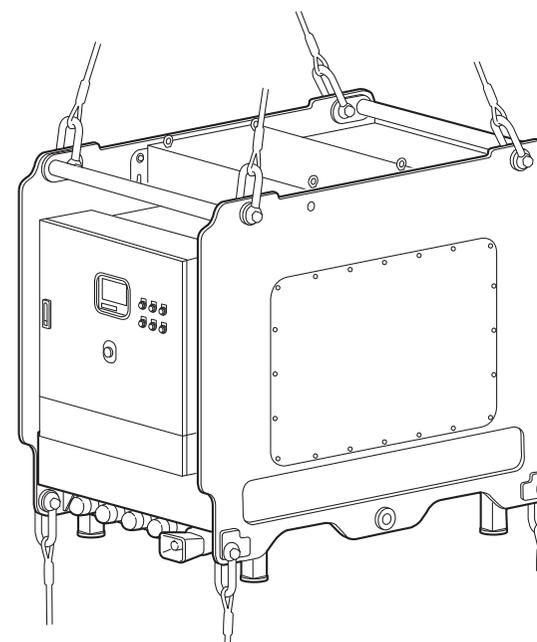

			月																																
NO	点検事項	主眼点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	本体外観	変形、損傷はないか？																																	
2	電源・通信線	損傷はないか？電源電圧は正常か？																																	
3	フライホイール	異音、振動はないか？起動時間は正常か？																																	
4	ジンバル	異音、振動はないか？円滑に動作するか？																																	
5	制御盤・バッテリー	コネクタ、ケーブル、盤外観に損傷は無いか？																																	
6	ランプ	破損はないか？規定の条件で点灯・点滅するか？																																	
7	無線機	操作指令通りにSJが円滑に動作するか？																																	
8	ブレーカ	テストボタンによる遮断動作確認はよいか？																																	
9	非常停止	釦に損傷はないか？非常停止は動作するか？																																	
点検実施状況	作業責任者が点検を確認してサインする																																		
	管理責任者確認欄																																		

作業開始前点検の結果は次の記号で記入する 良好 ◯ 調整及び要修理 × 調整または補修したとき ○ 該当なし -
